

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области по
стратегическому развитию и приоритетным
проектам (протокол от 26.06.2020 № СЖ-Пр-1321)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Томская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Томская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Огородова Л.М.	заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу		
Руководитель регионального проекта	Грабцевич И.Б.	начальник Департамента общего образования Томской области		
Администратор регионального проекта	Вторина Е.В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	
		Подпрограмма		

2.

2024									
, () -									
/	()			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	,	0,0000	01.06.2018	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
2	, , -	0,0000	01.01.2018	5,0000	15,0000	30,0000	50,0000	80,0000	90,0000
3	, ,	0,0000	01.01.2018	10,0000	15,0000	40,0000	60,0000	85,0000	95,0000

3.

/	,	()	,							
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
():										
1			14	115	382	382	382	382	2024	, ,
2	100% , ()		20	40	70	100	-	-	2022	()


	(")								:- ;- ' () , , , , 204 7 2018 .	
3	15 . 25% ,		-	2	5	8	12	15	2024 15 , 25 % , ,	()

5			-	115	382	382	382	382			()

2.1.2.		0,00	13 264,85	12 380,21	18 510,21	0,00	0,00	44 155,26
2.2.	(,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	,	0,00	2 653,00	2 476,00	3 702,00	0,00	0,00	8 831,00
3								
3.1.	,	0,00	53 050,80	108 588,70	182 970,40	0,00	0,00	344 609,90
3.1.1.		0,00	53 050,80	108 588,70	182 970,40	0,00	0,00	344 609,90
3.1.1.1. 4.		0,00	53 050,80	108 588,70	182 970,40	0,00	0,00	344 609,90
3.1.2.		0,00	53 050,80	108 588,70	182 970,40	0,00	0,00	344 609,90
3.2.	(,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	:	37 934,59	302 744,30	728 634,14	208 226,21	0,00	0,00	1 277 539,23
	, :	37 934,59	300 091,30	726 158,14	204 524,21	0,00	0,00	1 268 708,23

	37 934,59	300 091,30	726 158,14	204 524,21	0,00	0,00	1 268 708,23
	33 251,60	274 142,35	657 594,88	201 480,61	0,00	0,00	1 166 469,43
()	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2 653,00	2 476,00	3 702,00	0,00	0,00	8 831,00

6.

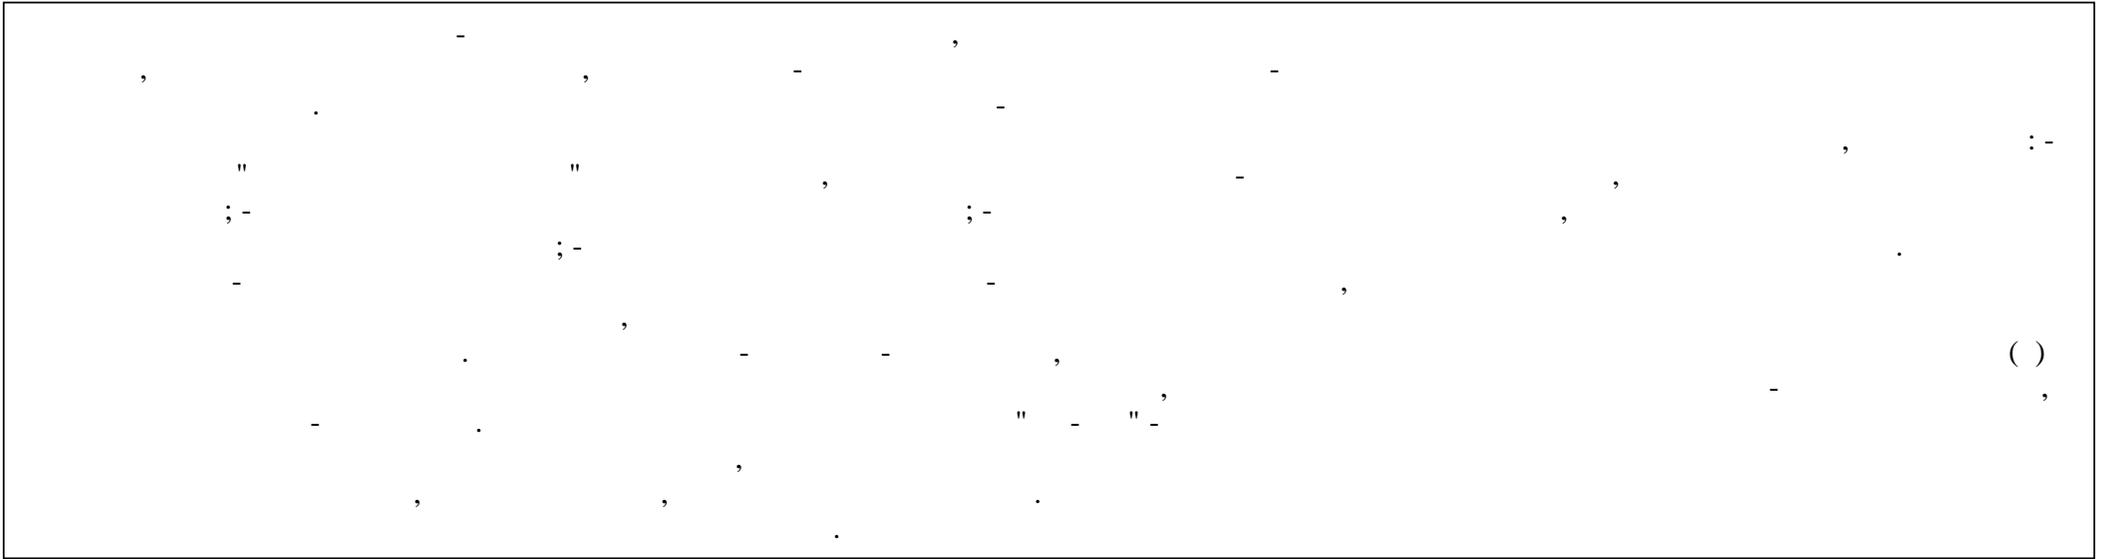

()

/	, ,				
1	"100% () , () ")" (-	31.12.2022	. . ,	2022 , , :- , ; - (,) , , , , ,

/	, ,				
					204
1.1	" , "	-	15.12.2019	. ,	-
1.1.1	" () , , 2019 "	01.07.2019	20.09.2019	. ,	
1.1.2	" , "	01.09.2019	15.11.2019	. ,	,
1.1.3	"	01.09.2019	30.11.2019	. ,	-

/	, ,				
	, "				
1.1.4	" , "	01.12.2019	15.12.2019	. . ,	-
1.2	, " , "	-	15.12.2020	. . ,	-
1.2.1	" () , , 2020	09.01.2020	01.03.2020	. . ,	
1.2.2	"	01.07.2020	01.08.2020	. . ,	-

/	, ,				
	, "				
1.2.3	" , "	01.03.2020	01.11.2020	. .,	,
1.2.4	" , "	01.11.2020	15.12.2020	. .,	-
1.3	" , , "	-	15.12.2021	. .,	-
1.3.1	" () , ,	09.01.2021	01.03.2021	. .,	

/	, ,				
	" , 2021				
1.3.2	" , "	01.07.2021	01.08.2021	. . ,	-
1.3.3	" , "	01.03.2021	01.11.2021	. . ,	,
1.3.4	" , "	01.11.2021	15.12.2021	. . ,	-
1.4	" , "	-	15.12.2022	. . ,	-

/					
1.4.1	" () , , 2022 "	09.01.2022	01.03.2022	. . ,	
1.4.2	" , "	01.07.2022	01.08.2022	. . ,	-
1.4.3	" , "	01.03.2022	01.11.2022	. . ,	,
1.4.4	" , "	01.11.2022	15.12.2022	. . ,	-
2	"	-	31.12.2024	. . ,	2024

/	, ,				
	"				, , -
2.1	- "	-	30.11.2019	. ,	-
2.1.1	" , ,	01.04.2019	01.07.2019	. ,	
2.1.2	" ,	01.06.2019	01.10.2019	. ,	

/	, ,				
					" " 2019
2.3.1	"	01.09.2019	31.12.2019	. .,	
	" " 2019 "				« » » 2019
2.4	" - "	-	15.12.2020	. .,	-
2.4.1	" , - "	20.02.2020	01.04.2020	. .,	
2.4.2	" ,	01.03.2020	01.11.2020	. .,	

/	, ,				
					" " 2020
2.6.1	" " 2020 "	01.09.2020	31.12.2020	. .,	" " 2020
2.7	- "	-	15.12.2021	. .,	-
2.7.1	" , - , "	20.02.2021	01.04.2021	. .,	
2.7.2	" ,	01.03.2021	01.11.2021	. .,	

/	, ,				
	"				
2.7.3	" , , "	01.10.2021	01.12.2021	. . ,	
2.8	" - "	-	20.12.2021	. . ,	-
2.8.1	" , " 2021	01.03.2021	01.04.2021	. . ,	
2.8.2	" , " ""	01.02.2021	20.12.2021	. . ,	-
2.9	" "	-	31.12.2021	. . ,	

/	, ,				
					" " 2021
2.9.1	" " 2021 "	01.09.2021	31.12.2021	. ,	" " 2021
2.10	" - "	-	20.12.2022	. ,	-
2.10. 1	" ,	01.03.2022	01.04.2022	. ,	

/	, ,				
	2022				
2.10. 2	" , " ""	01.02.2022	20.12.2022	. . ,	-
2.11	" "	-	31.12.2022	. . ,	" " 2022
2.11. 1	" " " 2022 "	01.09.2022	31.12.2022	. . ,	" " 2022

/	,				
2.12	" - "	-	31.12.2023	. .,	-
2.12. 1	" " 2023-2024 "	01.06.2022	08.07.2022	. .,	" " 2023-2024 "
2.12. 2	" " 2023-2024 "	01.01.2023	15.02.2023	. .,	2023-2024

/	, ,				
	" " 2023-2024 "				
2.12. 3	" , " 2023	01.03.2023	01.04.2023	. . ,	
2.12. 4	" , " ""	01.02.2023	20.12.2023	. . ,	-
2.13	" "	-	31.12.2023	. . ,	" " 2023
2.13. 1	"	01.09.2023	31.12.2023	. . ,	

/	, ,				
	" " 2023 "				" " 2023
2.14	" - "	-	20.12.2024	. .,	-
2.14. 1	" , 2024 "	01.03.2024	01.04.2024	. .,	
2.14. 2	" , " ""	01.02.2024	20.12.2024	. .,	-
2.15	" "	-	31.12.2024	. .,	

/	, ,				
					" " 2024
2.15. 1	" " 2024 "	01.09.2024	30.12.2024	. .,	" " 2024
3	" 25% 15 . , " ;	-	31.12.2024	. .,	2024 15 , 25% , :- ;- ,

/	,				
					;- ,
3.1	"	-	31.12.2020	.,	-
3.1.1	"	09.01.2020	01.02.2020	.,	
3.1.2	"	01.02.2020	01.06.2020	.,	,
3.1.3	"	01.04.2020	01.06.2020	.,	-

/	,				
3.1.4	"	01.02.2020	15.12.2020	.	-
	"				
3.1.5	"	01.09.2020	15.12.2020	.	-
	"				
3.2	"	-	15.12.2021	.	-
	,				
	"				
3.2.1	"	09.01.2021	01.02.2021	.	
	,				
	"				
3.2.2	"	01.02.2021	01.06.2021	.	,

/	, ,				
	"				
3.2.3	" "	01.04.2021	01.06.2021	. . ,	-
3.2.4	" "	01.02.2021	15.12.2021	. . ,	-
3.2.5	" "	01.09.2021	15.12.2021	. . ,	-
3.3	" , "	-	15.12.2022	. . ,	-
3.3.1	" ,"	09.01.2022	01.02.2022	. . ,	

/	, ,				
	"				
3.3.2	" "	01.02.2022	01.06.2022	. . ,	,
3.3.3	" "	01.04.2022	01.06.2022	. . ,	-
3.3.4	" "	01.02.2022	15.12.2022	. . ,	-
3.3.5	" "	01.09.2022	15.12.2022	. . ,	-
3.4	" ,	-	15.12.2023	. . ,	-

/	, ,				
	"				
3.4.1	" , "	09.01.2023	01.02.2023	. . ,	
3.4.2	" "	01.02.2023	01.06.2023	. . ,	,
3.4.3	" "	01.04.2023	01.06.2023	. . ,	-
3.4.4	" "	01.02.2023	15.12.2023	. . ,	-
3.4.5	"	01.09.2023	15.12.2023	. . ,	-

/	,				
	"				
3.5	,"	-	15.12.2024	.,	-
3.5.1	,"	09.01.2024	01.02.2024	.,	
3.5.2	"	01.02.2024	01.06.2024	.,	,
3.5.3	"	01.04.2024	01.06.2024	.,	-

/	, ,				
3.5.4	" "	01.02.2024	15.12.2024	. . ,	-
3.5.5	" "	01.09.2024	15.12.2024	. . ,	-
4	" "IT- ""	-	31.12.2024	. . ,	2024 3 "IT- ", - (, , ,) ,

/	, ,				
4.1	" ()"	-	01.03.2020	. .,	
4.1.1	" «IT- ») (2020-2022 ."	08.06.2019	08.07.2019	. .,	
4.1.2	" «IT- »)" (01.01.2020	15.02.2020	. .,	
4.2	" (,)"	-	30.10.2020	. .,	

/	, ,				
4.2.1	" - "IT- ""	01.09.2019	30.10.2019	. . ,	, " "
4.2.2	" , "IT- ""	09.01.2020	15.04.2020	. . ,	
4.2.3	" "IT- "; , , "	01.03.2020	25.08.2020	. . ,	-
4.3	" () (,)"	-	31.12.2021	. . ,	

/	, ,				
4.3.1	"IT- ""	01.09.2020	30.10.2020	. . ,	, " "
4.3.2	"IT- ""	09.01.2021	01.03.2021	. . ,	
4.3.3	"IT- "; , "	01.03.2021	25.08.2021	. . ,	-
4.4	"	-	31.12.2022	. . ,	

/	, ,				
) (, ()"				
4.4.1	" - "IT- ""	01.09.2021	30.10.2021	. . ,	, " "
4.4.2	" , "IT- ""	09.01.2022	01.03.2022	. . ,	
4.4.3	" "IT- "; , , "	01.03.2022	25.08.2022	. . ,	-

/	, ,				
5	"	-	31.12.2024	. ,	,
5.1	" "	-	15.12.2020	. ,	-
5.1.1	" "	01.02.2020	01.12.2020	. ,	-
5.1.2	"	01.01.2020	01.12.2020	. ,	-

/	,				
	"				
5.2	"	-	15.12.2021	..,	-
	"				
5.2.1	"	01.02.2021	01.12.2021	..,	-
	"				
5.2.2	"	01.01.2021	01.12.2021	..,	-
	"				
5.3	"	-	15.12.2022	..,	-
	"				

/	,				
5.3.1	"	01.01.2022	01.12.2022	. .,	-
	"				
5.4	"	-	15.12.2023	. .,	-
	"				
5.4.1	"	01.01.2023	01.12.2023	. .,	-
	"				
5.5	"	-	15.12.2024	. .,	-
	"				
5.5.1	"	01.01.2024	01.12.2024	. .,	-
	"				

()

()

1.

--

3.

/		,			()
1		100
2		100
3		25
4		25
5		25
6		25
7		25

100%		()		(, ")	
8		25
9		25
10		25
"IT- "					
11		60
12		25
13		25
15 . , 25% ,					

14		25
15		25
